

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	177/2018/5/2/9	Datum van bezoek: Date de visite:	2/05/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	MARTON CRISTIAN-ALEXANDRU Avenue du Duc Jean 17 2 G - 1083 BRUXELLES (GANSBAREN) BTW BE 0670.932.766	IK: CI:	
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	47835167-2002 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Avenue Winston Churchill 232 BETAGE 4 GAUCHE - 1180 BRUXELLES (UCCLE)		
Eigenaar: Propriétaire:	ROUSSEAU ETIENNE Avenue Winston Churchill 232 - 1180 BRUXELLES (UCCLE)		
Installateur:	MARTON CRISTIAN-ALEXANDRU	BTW/TVA:	BTW BE 0670.932.766
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hb: 85	Art. onderzoek: 271							
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	ETAGE 4 GAUCHE							
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:							
3x230V	3 x 10 mm² VOB	40A							
Aardelektrode / Electrode de terre:	? Ohm Isolatie / Isolément:	58,7 MOhm							
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2							
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 11								
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	GENERAL TD 1 HALL	OK	OK	271			
40A	30mA	A/s	GENERAL TD 2 APPARTEMENT CIRCUITS O-Y	OK	OK	271			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	NOK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	NOK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK


Inbreuken / Infractions:

A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre - COUPE TERRE A INSTALLER, VALEUR TERRE ENCORE A VERIFIER (COPROPRIETE)
I3: Indirecte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible - COUPE TERRE A INSTALLER, VALEUR TERRE ENCORE A VERIFIER (COPROPRIETE)

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

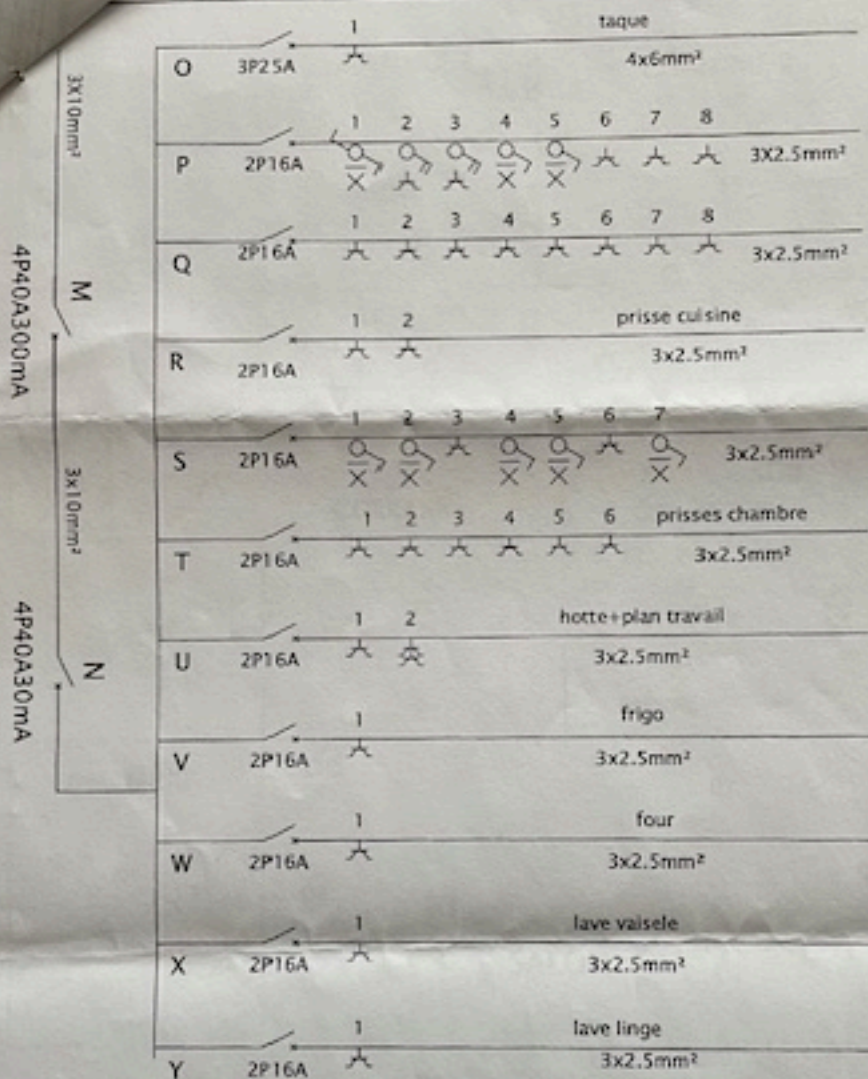

Service responsable ETIENNE ROUSSEAU	Reference technique 3X230V	Orateur: MARTON CRISTIAN AV DU DUC JEAN 17/2 1083 BE 0670932766	Approuvé	
		Type de document schéma unifilaire	Statut du document	feuille
		Titre, titre supplémentaire WINSTON CHURCHILL 232 4ème/gauche 1180/UCCLE	Date de publication 01-May-18	Page 1/1
		 ELECTROTEST Koen Haecour Projecteur Koen Haecour@electro-test.be Gsm 0478 751 200	Lang.	

Groupe terre encore à installer.
 Installation dans l'appartement OK

2/5/18

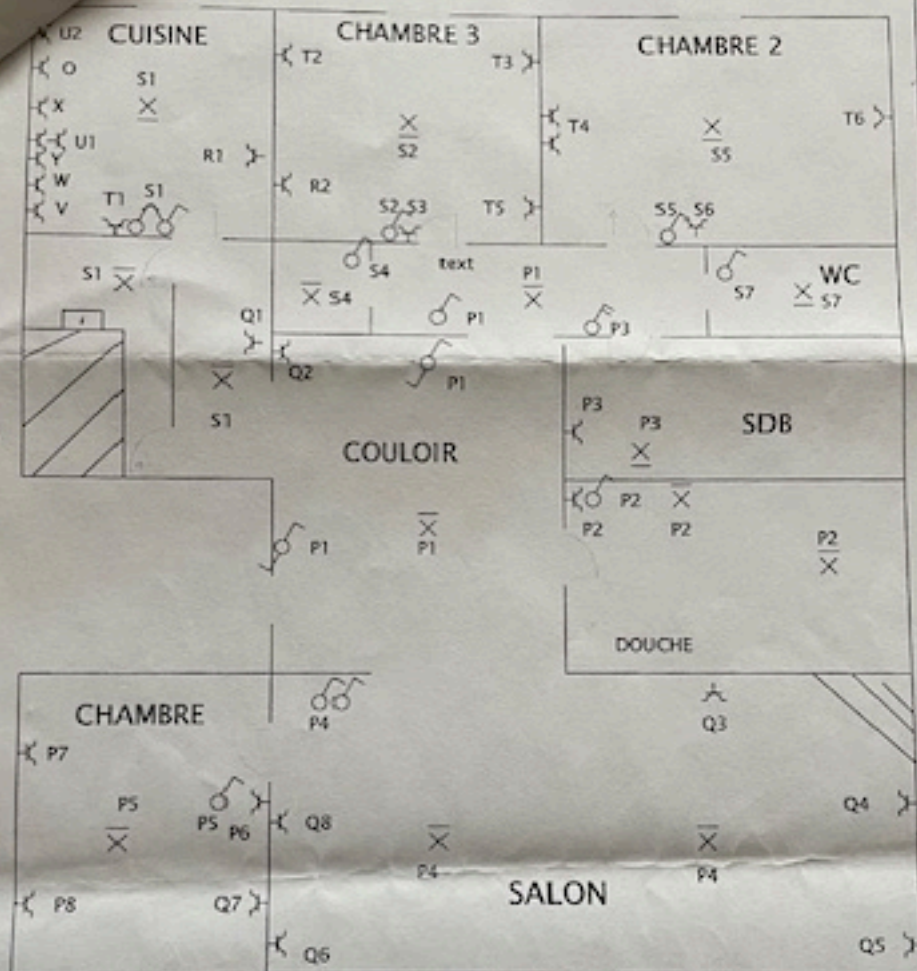

Service responsable ETIENNE ROUSSEAU	Référence technique 3X23-0V	Créateur MARTON CRISTIAN AV DU DUC JEAN 17/2 1083 BE 0670932766	Approuvé		
		Type de document schéma position	Statut du document		Echelle
		Titre, titre supplémentaire WINSTON CHURCHILL 232 4ème/gauche 118/LUCILE	Date de publication 30-Apr-18	Lang. Page 1/1	

ELECTROTES
Koen Hacour
Ingénieur
Jean-Jacques Quenette 0478 26 00 00
Gen 2013 121 BSC

2/5/18

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Voluntad controlada/Problemas reales de control.

Salmon

[illegible]
